


RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Jun/24





Perspectiva

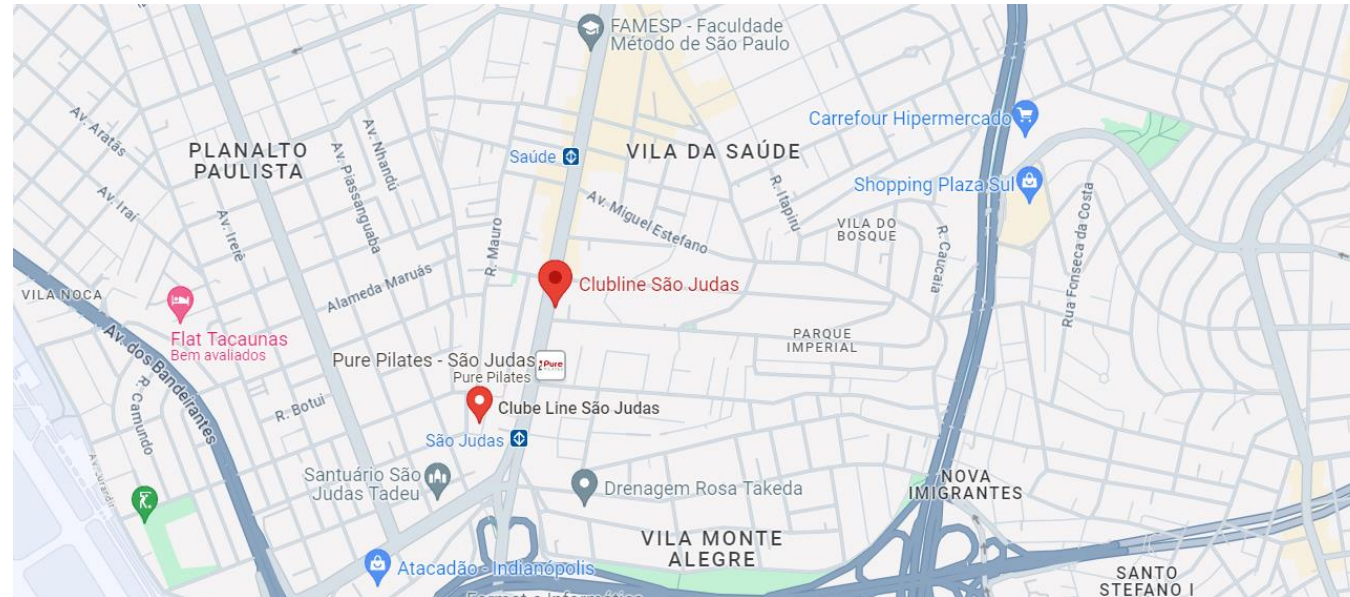

Av. Jabaquara, 2031 - Mirandópolis, São Paulo - SP, 04045-003

VIEWCO



Incorporadora & Construtora



Empreendimento

“ClubLine São Judas é um projeto completo, localizado na melhor região do Planalto Paulista, em uma rua arborizada, segura e tranquila estando ao lado da estação São Judas, Shoppings Ibirapuera, Santa Cruz e Plaza Sul. Oferece lazer completo para você e sua família com salas de jogos, piscina, salão de festas, quadra esportiva, spar, academia, churrasqueira e playground. Além disso, possui uma área de vivência no rooftop oferecendo uma linda vista da cidade paulistana.”

Área Comum



O empreendimento **ClubLine São Judas** é composto por 3 torres com 17 pavimentos contemplando 697 unidades + 9 unidades comerciais. A área de lazer possui piscina, academia, sala de jogos, playground, salão de festas, churrasqueira, quadra, pet place, cinema, brinquedoteca e área de vivência. As unidades possuem de 27 a 49 m². Além disso, possui uma localização em um dos bairros mais valorizados de São Paulo estando próximo da avenida Jabaquara, estação de metrô, shoppings Ibirapuera, Santa Cruz e Plaza Sul, praças, bares e restaurantes. O empreendimento conta com diferenciais como:

- Coworking Independentes;
- Bicicletário;
- Infra Ar Condicionado;
- Forro de Gesso;
- Piso em Porcelanato;
- Delivery Locker;
- Estúdio para Influenciadores;
- Deck Molhado;
- Sistema de Reuso de Água;
- Rooftop Grill.

Todos os itens acima foram identificados no orçamento analítico e retiradas do site do empreendimento.

Pavimento Inferior



01. Piscina Adulto	07. Piquenique	13. Pit Stop	18. Coworking	23. Salão de Festas Infantil
02. Piscina Infantil	08. Pet Place	14. Cinema	19. Blog Studio	24. Brinquedoteca
03. Deck Molhado	09. Quadra de Beach Tennis	15. Salão de Jogos Juvenil	20. ClubLine Market	25. Espaço Grill
04. Playground	10. Fitness Center	16. Salão de Festas Juvenil	21. Laundry Room	26. Salão de Festas Adulto
05. Redário	11. SPA	17. Beauty Care	22. Pet Lounge	27. Estacionamento
06. Praça do Relaxamento	12. Game Studio			

Layout 01 – 26,94m² (01 Dormitório):



Layout 02 – 39,35m² (02 Dormitórios):



Layout 03 – 48,93m² (03 Dormitórios):





▪ Características / diferenciais:


- Unidades com 01 suíte;
- Ventilação natural nos banheiro;
- Otimização das áreas de circulação;
- Infra de Ar Condicionado;
- Varanda Funcional.

Empresa:	VIEWCO 17 EMPREENDIMENTOS LTDA	
Construtora:	VIEWCO	
Data Vistoria:	03/07/2024	
Período de Medição:	03/06/2024 à 03/07/2024	
Segmento:	Residencial + Comercial	
nº torres:	1	
nº pavimentos:	18	
nº unidades:	312 Unidades	
Método construtivo:	Convencional de Concreto Armado	
Área privativa (m²):	26.216,38	(área das fases 1 e 2)
Área construída (m²):	40.089,94	(área das fases 1 e 2)
Área Equivalente Global (m²):	36.937,21	(área das fases 1 e 2)
Valor Orçado Inicial (R\$):	36.667.121,84	
Orçamento R\$ / m² área Equivalente.:	992,69	
Área Equivalente m² / m² Área privativa:	1,41	
Início obra:	jan-24	
Previsão término obra:	jun-25	
Quantidade de Meses de Obra:	18	
Vistoriador / CREA:	Amanda Missena CREA/SP 5070645994	

Orçamento (Atualizado por INCC)

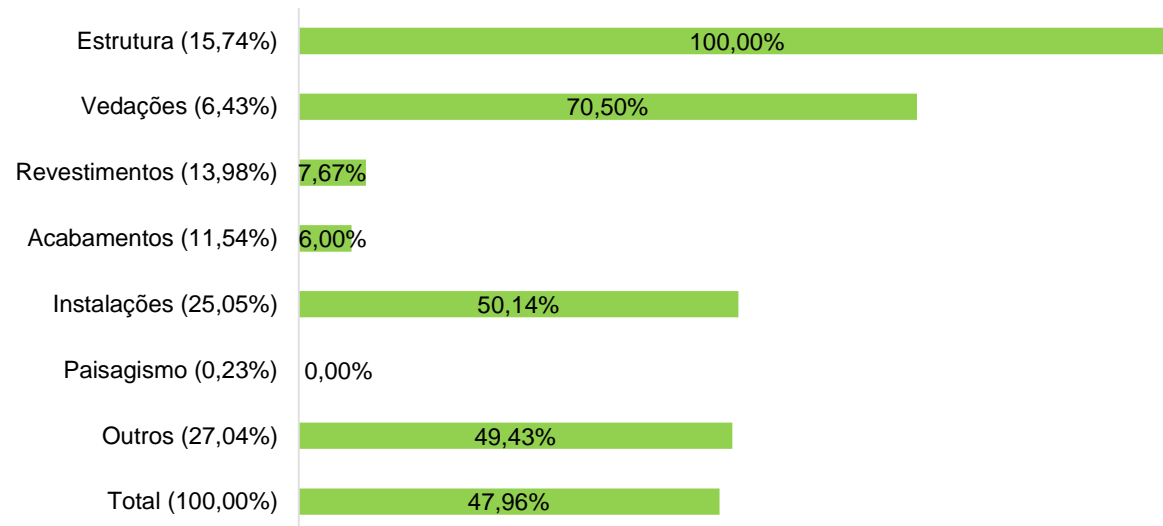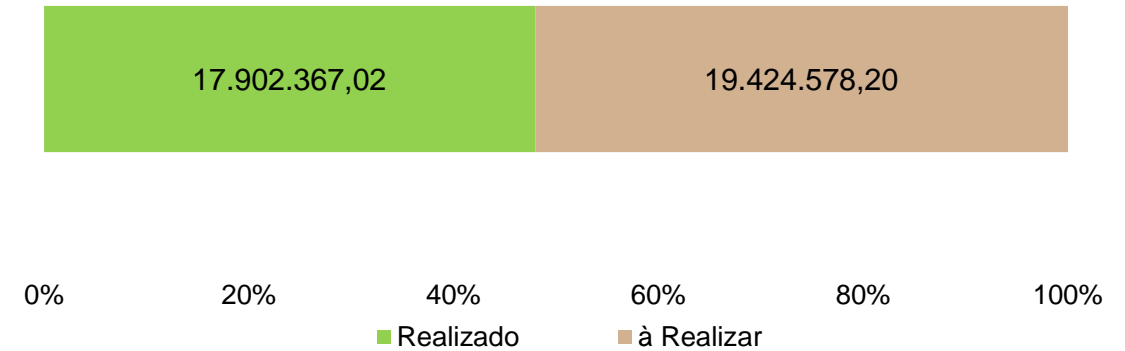

Evolução Acumulada

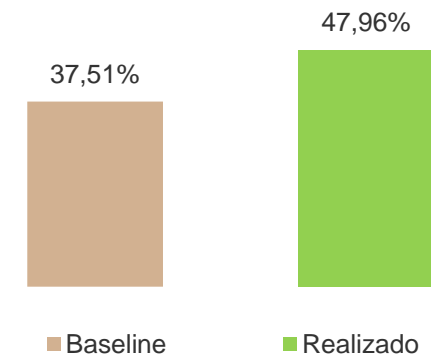

Obs.:

- O valor "A Realizar Atualizado INCC" representa o percentual físico a realizar de obra multiplicado pelo orçamento atualizado e não representa o valor financeiro a incorrer.

m	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Orçamento Atualizado INCC (R\$)	Peso Por Item	Realizado Anterior	Evolução no Período	Realizado Atual	A Realizar Atualizado INCC (R\$)
1	CUSTOS INICIAIS	688.402,48	700.790,26	1,88%	48,16%	1,85%	50,01%	350.334,23
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.212.906,98	1.234.733,19	3,31%	46,21%	2,13%	48,34%	637.814,73
3	PESSOAL PERMANENTE	3.513.435,37	3.576.659,50	9,58%	45,82%	2,15%	47,96%	1.861.258,72
4	EQUIPAMENTOS	1.027.782,59	1.046.277,49	2,80%	67,98%	5,86%	73,85%	273.640,04
8	ESTRUTURA DE CONCRETO	5.771.892,83	5.875.757,81	15,74%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00
9	COBERTURA	43.168,19	43.944,99	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	43.944,99
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	230.106,38	234.247,13	0,63%	97,26%	0,00%	97,26%	6.415,33
11	ALVENARIA E VEDAÇÕES	2.357.671,17	2.400.097,37	6,43%	65,03%	5,47%	70,50%	708.117,55
12	REVESTIMENTO INTERNO (paredes)	1.498.665,34	1.525.633,76	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	1.525.633,76
13	FORROS	740.963,67	754.297,28	2,02%	0,00%	1,13%	1,13%	745.769,59
14	PISOS , SOLEIRAS, DEGRAUS E RODAPÉS	1.087.592,66	1.107.163,85	2,97%	7,76%	7,06%	14,82%	943.028,62
15	ESQUADRIA DE MADEIRA (SINCOL)	696.065,91	708.591,59	1,90%	0,00%	0,00%	0,00%	708.591,59
16	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (JVM)	1.371.646,77	1.396.329,50	3,74%	2,81%	4,95%	7,77%	1.287.902,93
17	ESQUADRIA DE FERRO	721.129,95	734.106,65	1,97%	0,00%	13,75%	13,75%	633.191,73
18	REVESTIMENTO EXTERNO	1.349.014,49	1.373.289,95	3,68%	0,00%	0,00%	0,00%	1.373.289,95
19	PINTURA	1.141.700,35	1.162.245,20	3,11%	3,37%	0,84%	4,21%	1.113.329,49
20	VIDROS	178.428,35	181.639,16	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	181.639,16
21	BANCADAS E CAPAS DE PEDRA	330.773,34	336.725,59	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	336.725,59
22	INSTALAÇÕES ELETRICA	3.622.077,65	3.687.256,79	9,88%	42,37%	4,24%	46,61%	1.968.777,96
23	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INCÊNDIO	3.107.136,64	3.163.049,44	8,47%	61,65%	0,00%	61,65%	1.212.878,29
24	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	318.315,90	324.043,98	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	324.043,98
25	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	581.776,63	592.245,67	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	592.245,67
26	ELEVADORES	1.354.760,31	1.379.139,16	3,69%	73,86%	0,00%	73,86%	360.497,79
27	PAISAGISMO / ÁREAS EXTERNAS	250.753,00	255.265,29	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	255.265,29
28	MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	35.702,44	36.344,90	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	36.344,90
29	LIMPEZA GERAL	254.086,64	258.658,92	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	258.658,92
30	ADMINISTRAÇÃO (9,5%)	3.181.165,82	3.238.410,77	8,68%	45,82%	2,15%	47,96%	1.685.237,38
TOTAL (%)		36.667.121,84	37.326.945,22	100,00%	45,82%	2,15%	47,96%	19.424.578,20

Principais serviços realizados:

- Alvenaria e Vedação:
 - Marcação/ Elevação/ Fixação Alvenaria – Partes do 7º ao 9º Pav.
- Forros:
 - Chapisco Teto – 5º ao 6º Pav e partes do 4º.
- Pisos, Soleiras, Degraus e Rodapés:
 - Contrapiso – 3º ao 4º Pav e partes do 5º.
- Esquadria e Alumínio:
 - Chumbamento de Contramarcos – 16º ao 17º Pav.
- Esquadria de Ferro:
 - Guarda Corpo Varanda – Partes do 5º ao 10º Pav.
- Pintura:
 - Pintura Caição Poço do Elevador – 100%.
- Instalações Elétricas:
 - Tubulação em Alvenaria + Caixinhas – 3º ao 5º Pav;
 - Fundo de Quadro – 3º ao 6º Pav.

Serviços a serem realizados no mês seguinte:

- Alvenaria e Vedação:
 - Marcação/ Elevação/ Fixação Alvenaria.
- Pisos, Soleiras, Degraus e Rodapés:
 - Contrapiso.
- Revestimeto externo:
 - Chapisco/ Emboço.
- Esquadria de Ferro:
 - Guarda Corpo Varanda
- Esquadria de Alumínio:
 - Chumbamento de Contramarcos.
- Instalações Elétricas:
 - Tubulação em Alvenaria + Caixinha;
 - Fundo de Quadro.


Materiais em uso (alocado na obra):

- Blocos Cerâmico;
- Ensacados;
- Gradil;
- Revestimento Cerâmico;
- Eletrodutos;
- Contramarco;
- Caixas Elétricas;
- Tubos e Conexões.

Principais Contratações:

- Paisagismo – À Contratar.

Período	Previsto Baseline (mensal)	Previsto Baseline (acumulado)	Realizado (mensal)	Realizado (acumulado)	Varição
abr-24	28,12%	28,12%	38,46%	38,46%	10,34%
mai-24	4,40%	32,51%	7,36%	45,82%	13,30%
jun-24	5,00%	37,51%	2,15%	47,96%	10,45%
jul-24	6,32%	43,83%			
ago-24	6,07%	49,90%			
set-24	7,01%	56,91%			
out-24	7,80%	64,71%			
nov-24	7,78%	72,48%			
dez-24	7,33%	79,81%			
jan-25	5,91%	85,72%			
fev-25	4,21%	89,93%			
mar-25	3,36%	93,30%			
abr-25	2,95%	96,25%			
mai-25	2,07%	98,32%			
jun-25	1,68%	100,00%			

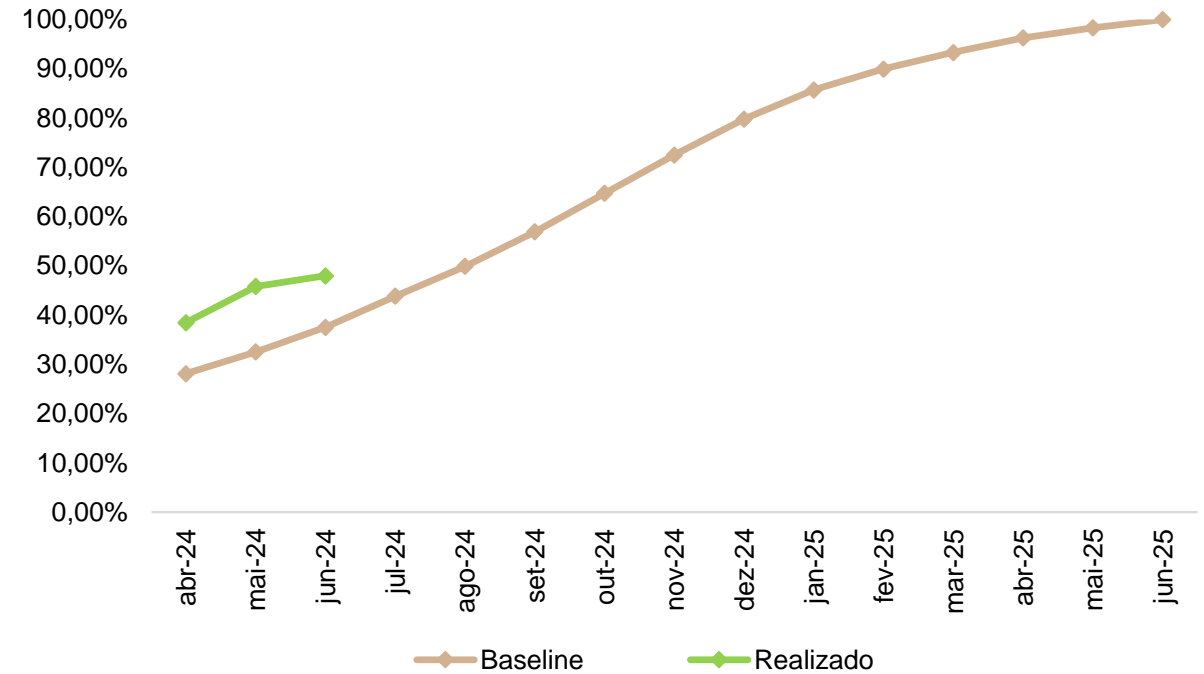

Obs.: Cronograma baseline base Abr/24.

- Abaixo segue a atualização do orçamento por INCC para a data base do relatório. O valor atualizado será utilizado para fazer o comparativo “físico-financeiro x caixa realizado”:

Orçamento:

Data Base:	fev-24
Custo Obra:	33.485.956,01
Taxa de Administração:	3.181.165,82
Total Obra (R\$):	36.667.121,84

INCC Base Orçamento:	1.091,25
Total Obra (INCC):	33.601,03
Data Relatório:	jun-24
INCC Base Relatório:	1.110,887
Total Obra (R\$ Atualizado INCC):	37.326.945,22

- ✓ A equipe de obra estava fazendo uso de equipamentos EPI's e EPC's, como: telas, sinalizações, proteções perimetral, bandejas, capacetes, botas e coletes. Conforme estabelecido pela NR's;
- ✓ Os serviços demonstram estarem sendo executados com qualidade, seguindo as normas de desempenho e conforme projetos;
- ✓ A obra apresentada boa conservação, se mantendo limpa e organizada.



Rede Piso a Piso




Tela Fachadeira



Bandeja de Proteção

- ✓ A medição foi acompanhado pelos Engenheiros da Viewco Genésio (Planejamento), Natan (Eng. Residente) e Maurício (Coordenador) em 03/07/2024;
- ✓ Foi utilizado para fazer a planilha de medição o orçamento de R\$ 36.667.121,84 base fev/24 enviado pela Viewco;
- ✓ A obra conta com 40 colaboradores, sendo 5 indiretos;
- ✓ A previsão de entrega do empreendimento está para Jun/25.

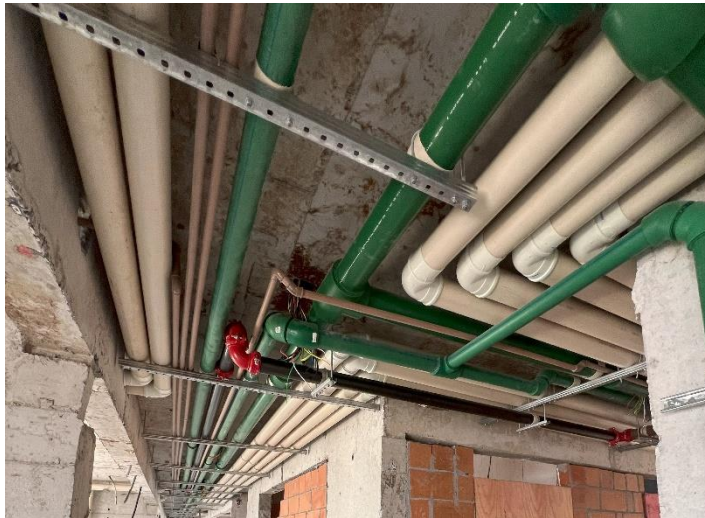

Distribuição Hidráulica – 17º Pav



Alvenaria/ Vedação – 16º Pav




Guarda Corpo – 14º Pav



Marcação de Alvenaria – 13º Pav



Prumada – 10º Pav

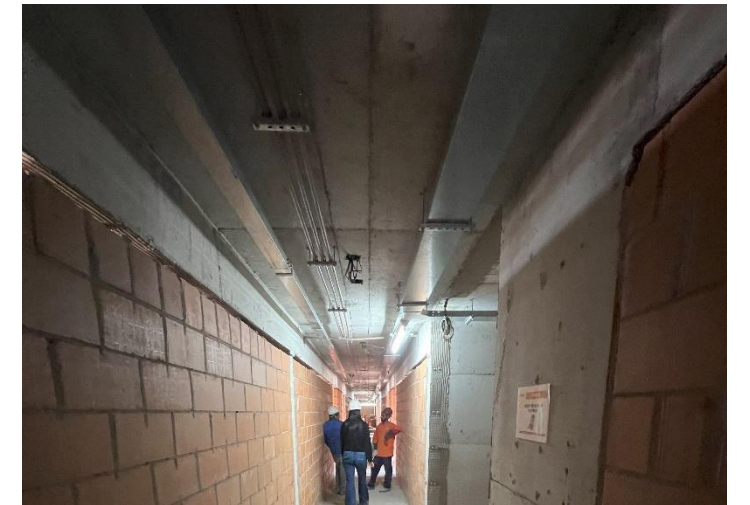

Eletrocalhas – 9º Pav



Alvenaria/ Vedação – 8º Pav



Fundo de Quadro – 7º Pav




Cabos de Instalações – 6º Pav



Contrapiso – 5º Pav



Distribuição Hidráulica – 3º Pav

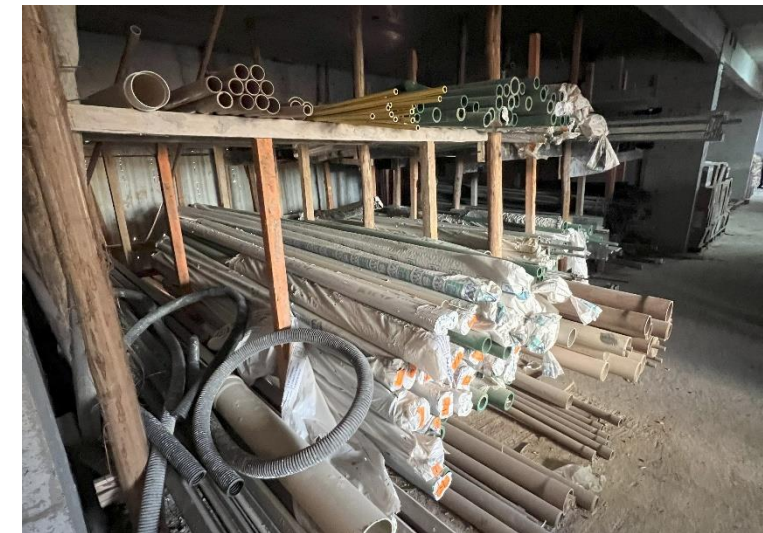

Estoque de Material (Tubos) – Térreo



Vista da Fachada



Vista da Fachada Lateral

Utilize o link ou QR code abaixo para visualização das demais fotos da obra:

https://drive.google.com/drive/folders/19Xd-htfMu2dKU8FbK_03kz9FzsYGWIZ6



Base Jun/2024
